CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (Rm)
protocollo@pec.guidonia.org - Tel 07743011

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Opera :
Intervento di promozione delle attività sportive attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano.

CUP: F93D21003010001 CIG: 946056620A

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TAV.		scala:
24.0	CRONOPROGRAMMA	_

Progettista:
Arch. Roberto Simonelli

RUP:
Arch. Cristina Zizzari

CSP:
Arch. Cinzia Pilli

Data:	
Marzo 2023	Revisione A.0

Nome attività	Durata
Pista "Bivio di Guidonia"	30 g
Preparazione delle aree di cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Pista pedonale	25 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g
Riposizionamneto cadtoia stradale	3 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g
Formazione di manto di usura e collegamento	9 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g
Zona fitness	5 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g
Installazione di attrezzatura fitness	1 g
Posa di pavimentazione antitrauma per esterni	3 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	2 g
Installazione di portabiciclette	2 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Pista "tratto La Botte"	304 g
Bonifiche da ordigni bellici	20 g
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni	14 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	6 g
Preparazione delle aree di cantiere Fase 1	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Pista ciclopedonale Fase 1	71 g
Risezionamento del profilo del terreno	6 g
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con m	11 g
Formazione di rilevato stradale	7 g
Formazione di fondazione stradale	5 g
Predisposizione impianto elettrico	4 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori	8 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in l	7 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	6 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	13 g
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g
Posa tubo Armco	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3 g
Smobilizzo del cantiere Fase 1	1 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Preparazione delle aree di cantiere Fase 2	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Pista ciclopedonale Fase 2	90 g
Risezionamento del profilo del terreno	3 g
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con m	5 g
Formazione di rilevato stradale	6 g
Formazione di fondazione stradale	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazi	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3 g
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calce	1 g
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acc	1 g
Posa di ringhiere e parapetti	3 g
Predisposizionei impianto elettrico	4 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori	9 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in l	7 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	10 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	19 g
Formazione di manto di usura e collegamento	11 g
Montaggio di guard-rails	9 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g
Smobilizzo del cantiere Fase 2	1 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Preparazione delle aree di cantiere Fase 3	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Pista ciclopedonale Fase 3	117 g
Risezionamento del profilo del terreno	7 g
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con m	13 g
Demolizione macere eseguita con mezzi meccanici	5 g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meco	6 g
Posa di recinzioni e cancellate	5 g
Formazione di rilevato stradale	24 g
Formazione di fondazione stradale	20 g
Predisposizionei impianto elettrico	8 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori	11 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in l	12 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	9 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	25 g
Formazione di manto di usura e collegamento	25 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g
Smobilizzo del cantiere Fase 3	1 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g

LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA

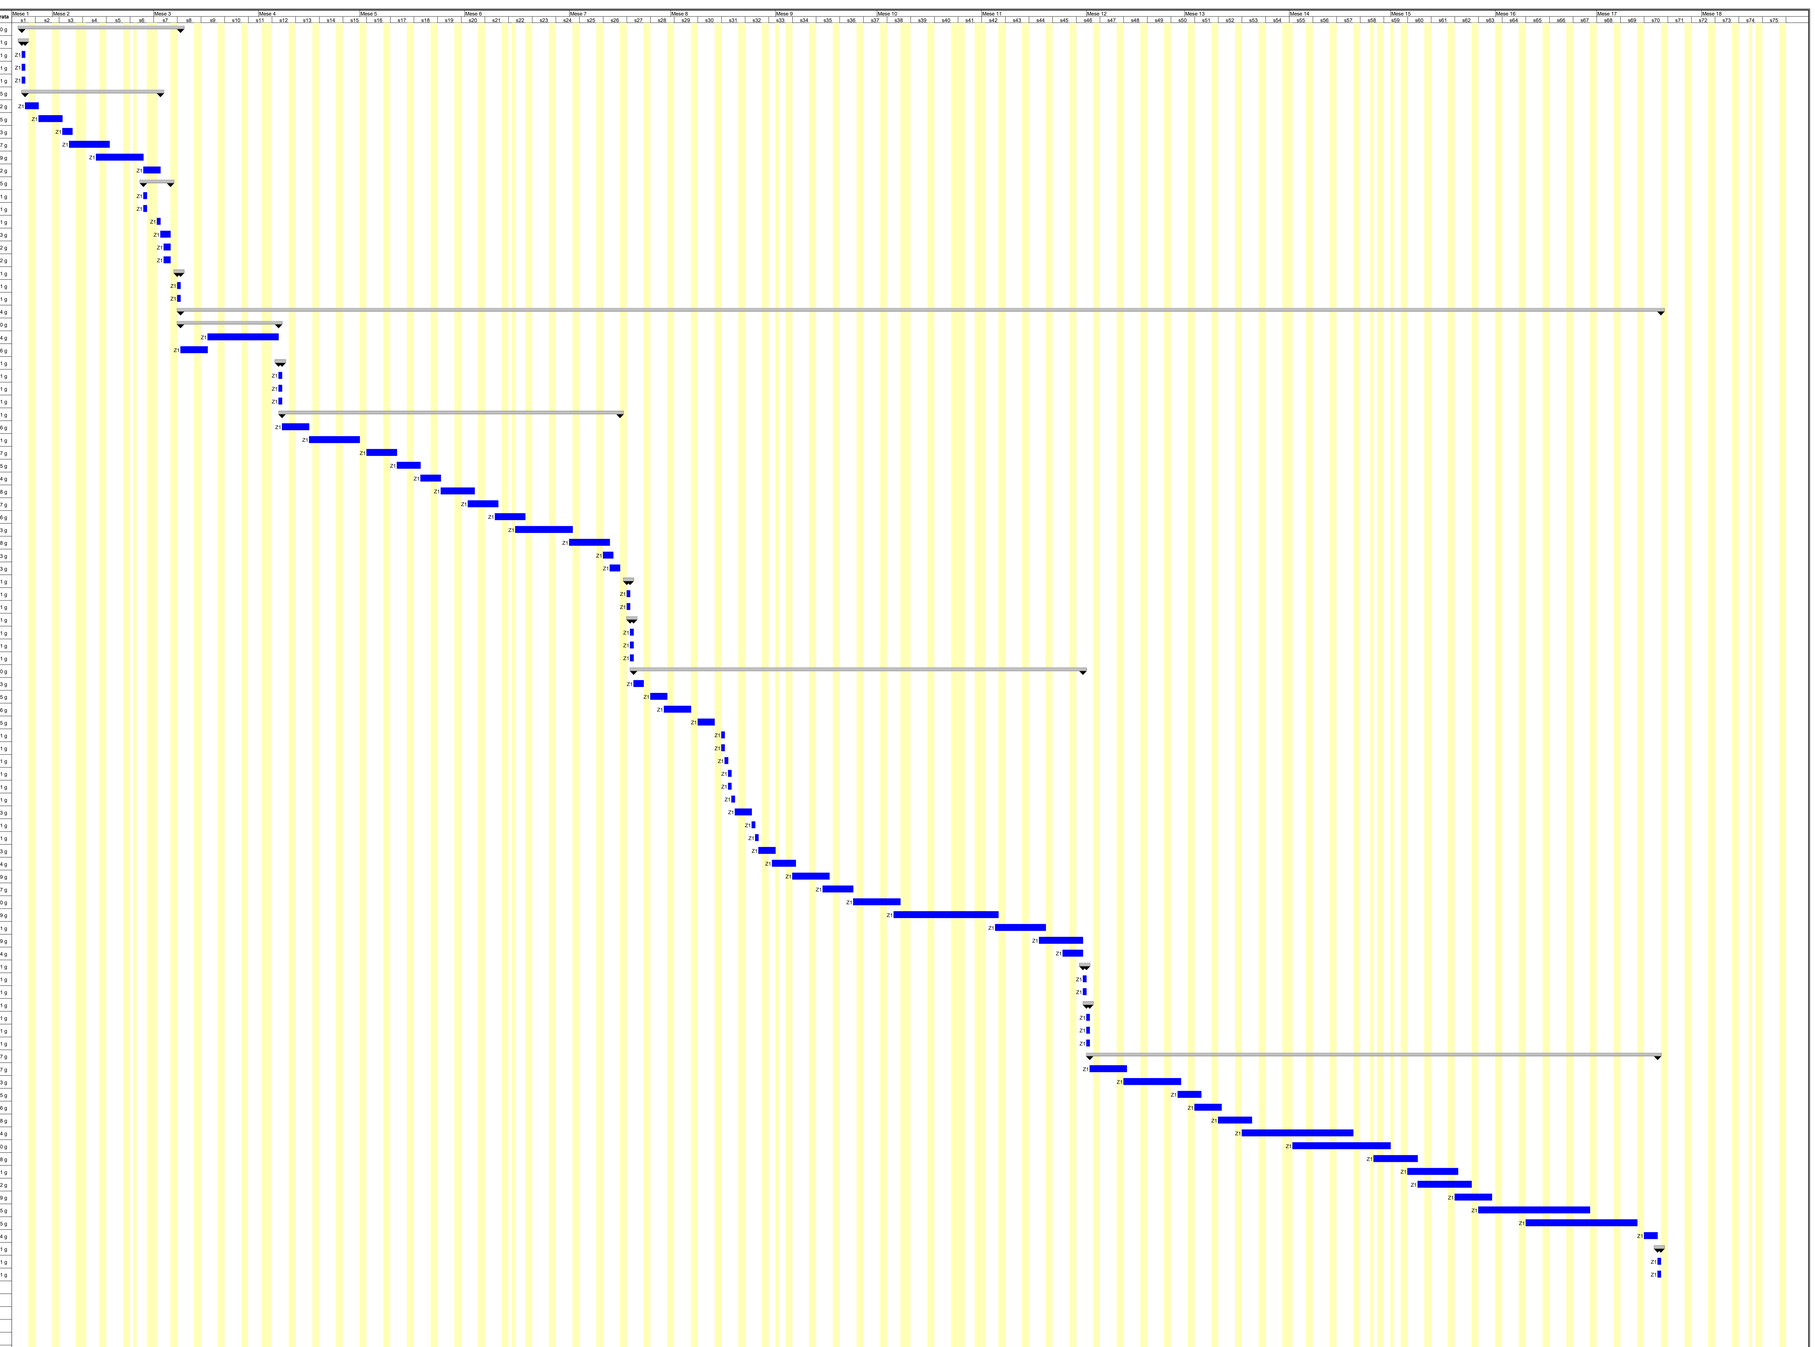

Comune di Guidonia Montecelio prot. arrivo n. 0036789 del 03-04-2023
